



**О ходе реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах на территории
городских округов Чувашской Республики**

Докладывает:
А.А. Грищенко – министр
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

18 ноября 2019 г.



Инициативное бюджетирование

Всего в городских округах реализуются
26 проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах:



Чебоксары
8 проектов



Новочебоксарск
4 проекта



Канаш
5 проектов



Шумерля
5 проектов



Алатырь
4 проекта

Алатырь

В городе Алатырь реализуются:



Наименование проекта	Объем финансирования			Срок начала строительства	Срок завершения строительства	Всего освоено	Процент освоения	
	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств:						
		республиканский бюджет	бюджет городского округа	юр.лиц и население				
Устройство школьного двора МБОУ «СОШ №2» г. Алатырь Чувашской Республики, расположенного по адресу: г. Алатырь, ул. Южная, д.3	1 045, 8	522, 9	261, 4	261, 4	13.08.2019	01.10.2019	0,00	21,9%
Устройство спортивно-игровой площадки в парке «Аллея земляков», расположенного по адресу: г. Ала-тырь, ул. Комарова	1 400,0	519, 5	180, 4	700,0	13.08.2019	01.10.2019	0,00	
Устройство спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Алатырь, ул. Московская, д.129	479, 2	239 ,6	119 ,8	119, 8	08.07.2019	27.08.2019	479,2	
Устройство детской игровой площадки во дворе мно-гоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Алатырь, ул. Березовая, д.5	468,8	234 ,4	117 ,1	117, 1	15.07.2019	03.09.2019	267,2	
Итого по г. Алатырь	3 393, 8	1 516, 4	678, 9	1 198, 4			746,4	

Канаш

В городе Канаш реализуются:

Наименование проекта	Объем финансирования				Срок начала строительства	Срок завершения строительства	Всего освоено	Процент освоения
	Всего, тыс. Руб.	в том числе за счет средств:						
		республиканский бюджет	бюджет городского округа	юр. лиц и население				
Благоустройство городского сквера Афганцев по ул.30 лет Победы, 9а	4 944, 5	1 977, 8	2 472, 2	494, 4	19.07.2019	16.09.2019	4796,2	96,8 %
Ремонт проезда автомобильной дороги на территории Элеватор в г. Канаш	4 016, 9	1 606, 7	1 405, 9	1 004, 2	19.07.2019	16.09.2019	3833,9	
Ремонт автомобильной дороги по улице Киевская, улице Кирова в г. Канаш	3 743, 7	1 198, 0	1 347, 7	1 198, 0	06.07.2019	03.09.2019	2995,0	
Ремонта автомобильной дороги по улице Садовая в г. Канаш	763,3	302, 2	345, 8	115, 2	15.07.2019	12.09.2019	763,3	
Ремонт участка автомобильной дороги по улице Красноармейская в г. Канаш протяженностью 510 м	3 774, 3	1 948, 0	1 704, 5	121, 7	19.07.2019	19.09.2019	3 774,3	
Итого по г. Канаш	17 243, 0	7 032, 9	7 276, 3	2 933, 7			16 702,15	



Новочебоксарск




В городе Новочебоксарск реализуются:

Наименование проекта	Объем финансирования				Срок начала строительства	Срок завершения строительства	Всего освоено	Процент освоения
	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств:						
		республиканский бюджет	бюджет городского округа	юр.лиц и население				
Текущий ремонт бассейна МБОУ "СОШ" №17 г. Новочебоксарска Чувашской Республики	1 000, 0	300,0	550, 0	150, 0	19.07.2019	31.08.2019	745,0	31,8 %
Ремонт спортивного зала МБОУ "СОШ №12" города Новочебоксарск ЧР	1 090, 0	327, 0	599, 5	163, 5	19.07.2019	31.08.2019	997,3	
Асфальтирование территории МБДОУ "Детский сад 45 "Журавлик" города Новочебоксарск ЧР	1 000, 0	300, 0	550, 0	150, 0	17.07.2019	11.09.2019	835,0	
Обустройство пешеходной дорожки вдоль тепличного проезда в городе Новочебоксарск	4 996, 1	1 498, 8	2 712, 3	785, 0	08.10.2018	01.10.2019	0,00	
Итого по г. Новочебоксарск	8 086, 1	2 425 ,8	4 411, 8	1 248, 5			2 577,3	

Чебоксары

В городе Чебоксары реализуются:

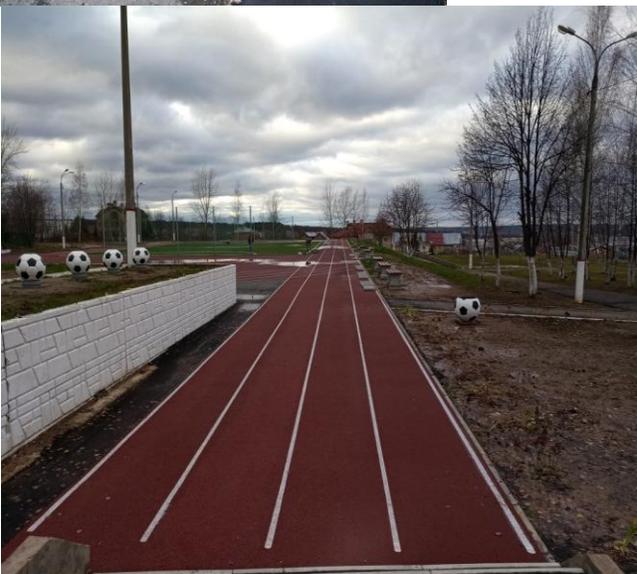

Наименование проекта	Всего, тыс. руб.	Объем финансирования			Срок начала строительства	Срок завершения строительства	Всего освоено	Процент освоения
		в том числе за счет средств:						
		республиканский бюджет	бюджет городского округа	юр.лиц и население				
Строительство объектов общественной инфраструктуры- системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных жилых домов Ленинского, Калининского районов г. Чебоксары с выводом видеоданных в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары	4 740, 7	948, 1	2 370,3	1 422, 2	05.11.2019	20.12.2019	0,00	43,8%
Строительство объектов общественной инфраструктуры- системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных жилых домов Московского района г. Чебоксары с выводом видеоданных в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары	5 008, 6	1 000, 0	2 506, 0	1 502,5	05.11.2019	20.12.2019	0,00	
Благоустройство территории, прилегающей к памятнику павшим воинам в п. Сосновка г. Чебоксары	4 654 , 0	930 ,8	3 253 ,2	470,0	12.08.2019	20.10.2019	4654,0	
Замена оконных блоков в МБОУ "СОШ №62 г. Чебоксары"	1 200, 0	240 ,0	780, 0	180,0	19.08.2019	01.11.2019	910,0	
Текущий ремонт дорожного покрытия, пешеходных сетей и малых архитектурных форм внутридомовых и придомовых территорий по адресу:г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д.7, корп.1	1 444, 8	288, 96	939, 12	216, 7	21.08.2019	30.11.2019	1332,89	
Устройство спортивной футбольной площадки на территории МАОУ "СОШ №59" г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. Лебедева, д.13	5 000, 0	1 000, 0	2 750, 0	1 250, 0	26.08.2019	31.12.2019	4411,26	
Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №43 г. Чебоксары по замене оконных блоков	1 849 ,8	369 ,9	1 202, 36	277, 5	26.08.2019	01.11.2019	1036,80	
производство ремонтных работ дорог в коттеджном поселке «Чандрово» в г. Чебоксары по ул. Лазурная , на участке от дома №51 до дома №115	4 999, 5	1 000,0	2 999,5	1 000, 0	28.10.2019	30.11.2019	0,00	
Итого по г. Чебоксары	28 897, 5	5 777 , 8	16 800, 6	6 319, 0			12665,56	

Шумерля

В городе Шумерля реализуются:



Наименование проекта	Объем финансирования				Срок начала строительства	Срок завершения строительства	Всего освоено	Процент освоения
	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств:						
		республиканский бюджет	бюджет городского округа	юр.лиц и население				
Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок» г. Шумерля ЧР	1 427,9	778,6	569,2	80,0	04.10.2019	30.11.2019	0,00	69,35 %
Ремонт кровли здания в МБДОУ "Детский сад 14 "Солнышко" города Шумерля	2 483,1	1 279,1	1 154,1	50,0	29.07.2019	30.09.2019	2339,09	
Текущий ремонт кровли здания в МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» г. Шумерля ЧР	1 453,2	769,7	575,0	108,5	29.07.2019	30.09.2019	1353,6	
Текущий ремонт кровли детского садика в МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик» г. Шумерля ЧР	1 846,8	991,3	823,4	32,0	29.07.2019	30.09.2019	1508,5	
Капитальный ремонт пожарных лестниц в детском саду в МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» г. Шумерля ЧР	1 515,4	247,1	1 218,2	50,0	22.10.2019	22.11.2019	851,1	
Итого по г. Шумерля	8 726,5	4 066,0	4 340,0	320,5			6052,29	



Информация о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования в 2019 году

№ п/п	Городской округ	Количество Реализуемых проектов, ед.	Предусмотрено всего, тыс. руб.	в том числе			Всего освоено Республиканский бюджет	Процент освоения РБ
				в том числе, тыс. руб.				
				РБ	МБ	ВБ		
1	Алатырь	4	3393,8	1 516,4	678,9	1198,4	466,4	30,7 %
2	Канаш	5	17 243,0	7 032,9	7 276,3	2933,7	6 716,5	95,5 %
3	Новочебоксарск	4	8 086,1	2 425,8	4 411,8	1 248,5	773,2	31,8 %
4	Чебоксары	8	28 897,47	5 777,8	16 800,65	6319,02	1 875,4	32,4 %
5	Шумерля	5	8 726,5	4 066,0	4 340,0	320,5	2 639,1	64,9 %
	Всего	26	66 347,1	20 819,1	33507,8	12 020,1	12 470,6	59,9%



Благодарю за внимание!
