



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ЧУВАШИИ



Проект «Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)»

Сектор развития территорий
отдела экономического анализа,
стратегического планирования
и прогнозирования

21 декабря 2021 года



Участники проекта

Руководитель проекта:

Столярова Надежда Юрьевна – первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Команда проекта:

Михайлова С.А. – заведующий сектором развития территорий Минэкономразвития Чуваши

Рафикова Л.А. – начальник отдела развития предпринимательства Минэкономразвития Чуваши


Модина И.В. – начальник отдела государственной политики в области земельных отношений Минэкономразвития Чуваши

Устенко И.Г. – начальник отдела аренды и контроля за использованием государственного Минэкономразвития Чуваши

Никифорова Н.И. – начальник отдела межбюджетных отношений Минфина Чувашии

Александров А.В. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Минсельхоза Чувашии

Шибалова Н.И. – начальник отдела реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии



Карточка проекта

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Дмитрий Иванович

Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики, структурные подразделения Минэкономразвития Чувашии

Границы процесса: от получения поручения от Администрации Главы Чувашской Республики о предоставлении информации до передачи информации в Администрацию Главы Чувашской Республики

Владелец процесса: заведующий сектором развития территорий отдела экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования Михайлова Светлана Анатольевна

Руководитель проекта: первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Столярова Надежда Юрьевна

Команда проекта: заведующий сектором развития территорий Михайлова Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт сектора развития территорий Храмова Екатерина Михайловна, начальник отдела государственной политики в области земельных отношений Модина Ирина Валентиновна, начальник отдела аренды и контроля за пользованием государственного имущества Устенко Ирина Геннадьевна, начальник отдела развития предпринимательства Рафикова Лариса Анатольевна, начальник отдела межбюджетных отношений Минфина Чувашии Никифорова Неонилла Ивановна, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Минсельхоза Чувашии Александров Алексей Валерьевич, начальник отдела реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии Шибалова Наталья Ивановна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков предоставления информации

Проблемы:

1. Необходимость личных обращений в структурные подразделения Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики;
2. Дублирование поручений.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения сведений	4 дня	7 часов
Сокращение дублирования поручений	2	0

4. Ключевые события проекта


1. Старт проекта – 12.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 12.07.2021
 - разработка текущей карты процесса – до 11.06.2021
 - разработка целевой карты процесса – до 12.07.2021
3. Kick-off – 18.08.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.12.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 25.12.2021

Цели проекта

- сокращение процесса формирования справки об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа) с *4 дней* до **7 часов**
- сокращение дублирования поручений с **2** до **0**




Текущая карта потока «Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)»

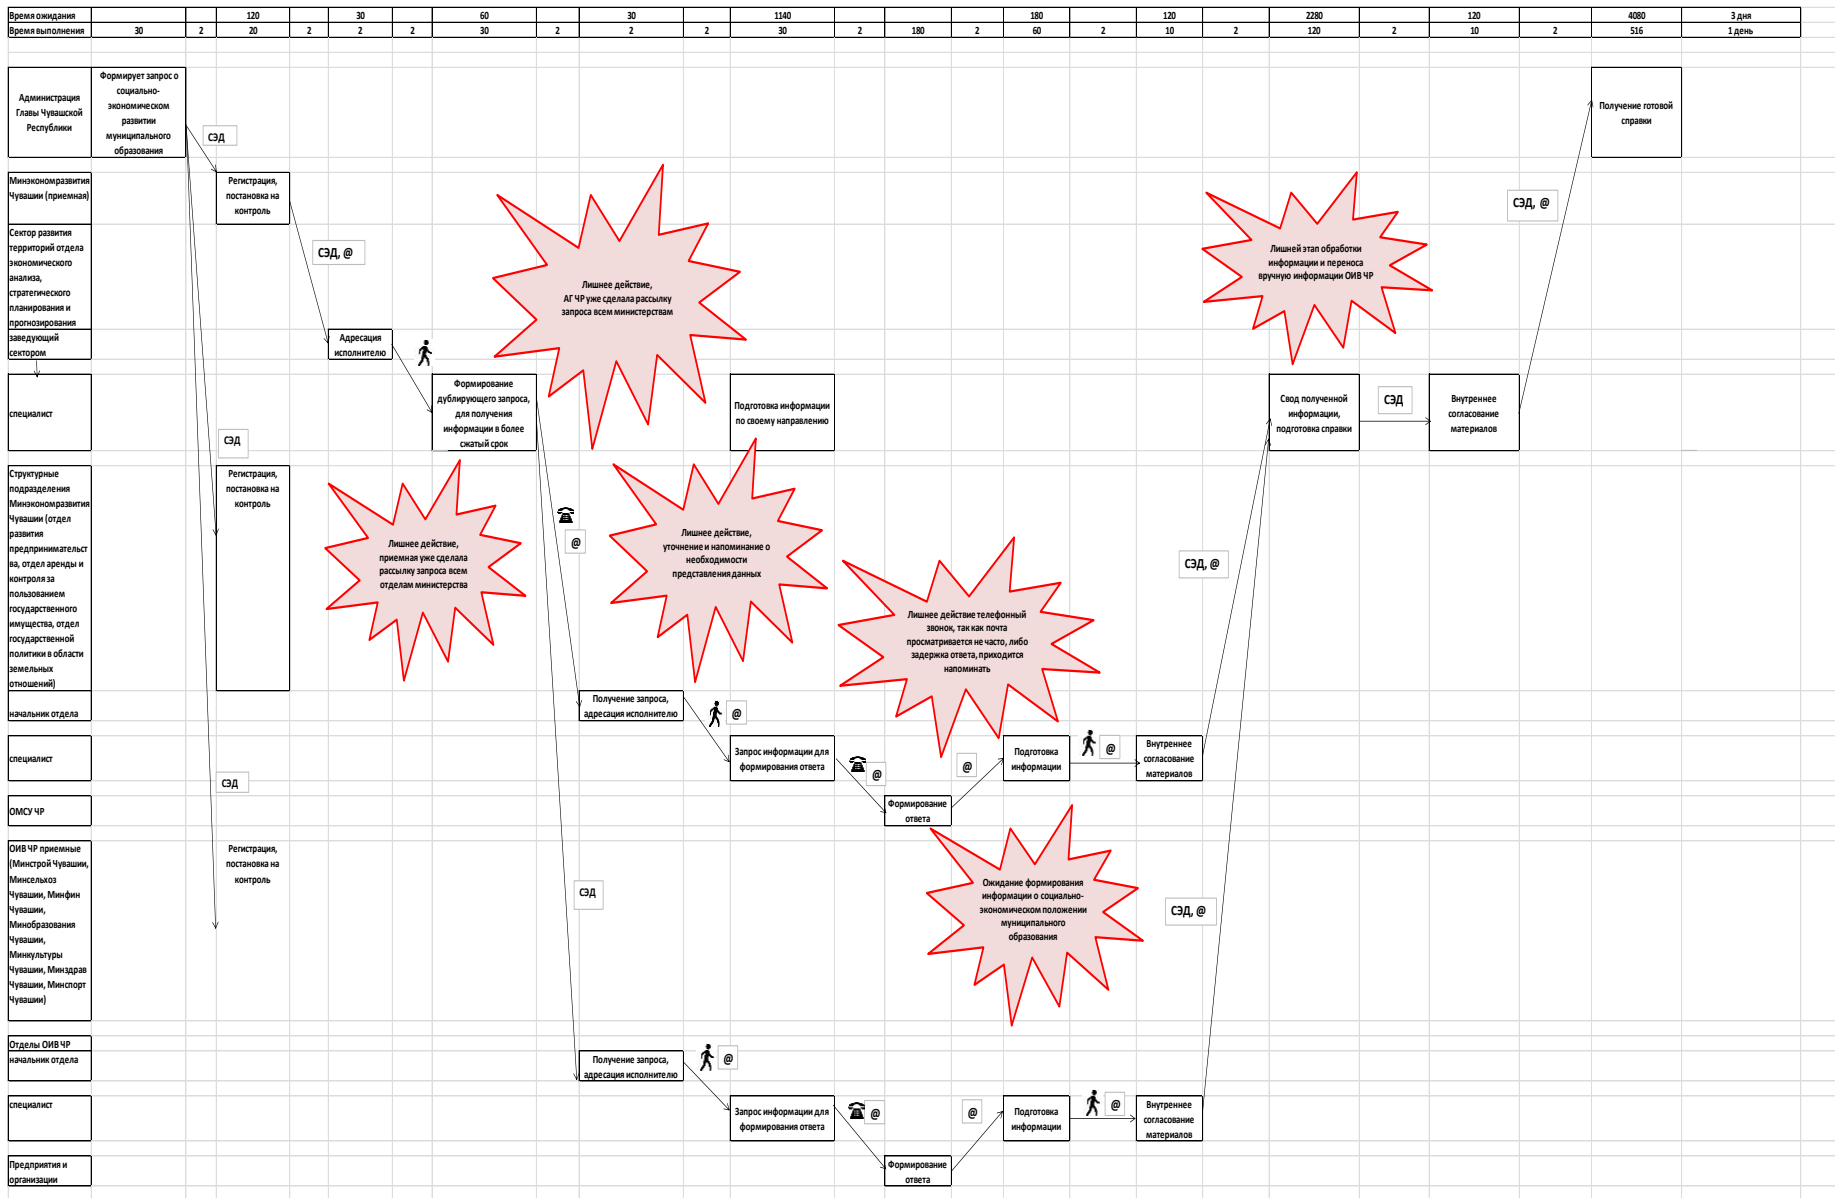

Целевая карта процесса подготовки и направления информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)

Время ожидания				180						180		360	6 часов
Время выполнения операции		30	2	10	2	15	2	15	2	10	2	56	1 час

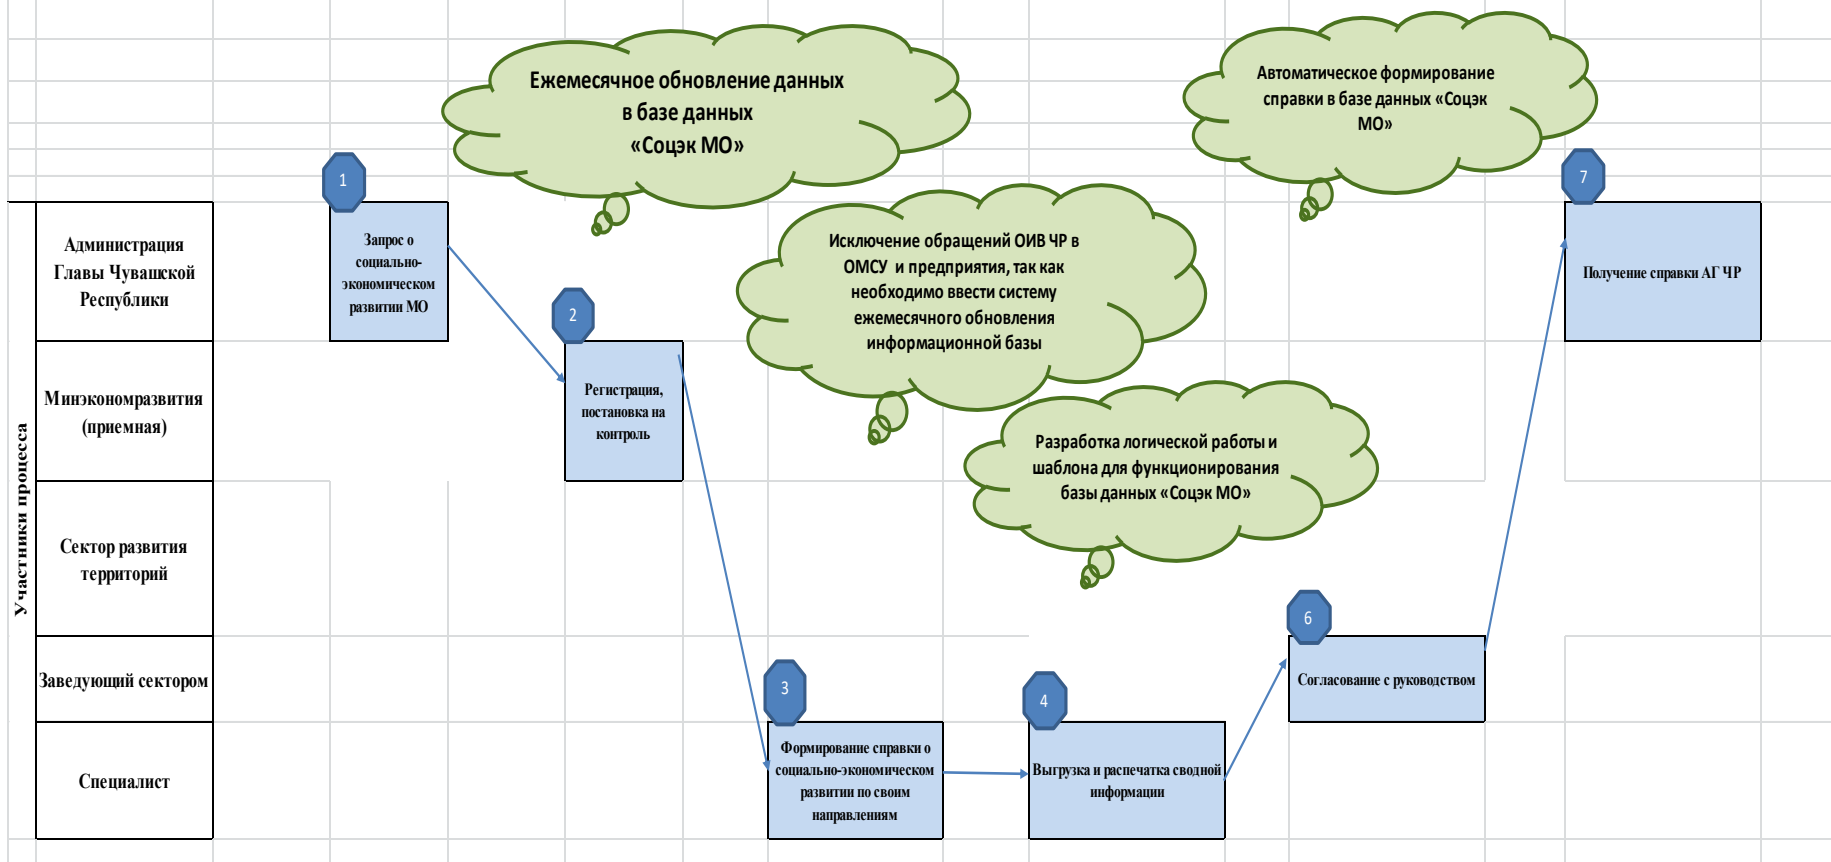

План мероприятий проекта «Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)»

№	Проблема	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	<p>Ожидание формирования информации о социально-экономическом положении муниципального образования;</p> <p>- лишний этап обработки информации и переноса вручную информации от ОИВ ЧР.</p>	1. Разработка логической работы базы данных «Соцэк МО»	до 1 ноября 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.А. Герасимова К.С.
		2. Разработка и утверждение шаблона для представления данных всеми ОИВ ЧР в базу данных «Соцэк МО»	до 15 ноября 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.А. Герасимова К.С.
		3. Подготовка инструкции по заполнению и формированию справок в базе данных «Соцэк МО» и рассылка во все ОИВ ЧР	до 1 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.А.
		4. Автоматическое формирование справки в базе данных «Соцэк МО» для последующего использования в работе	до 25 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.А.
		5. Утверждение нормативно-правовым документом работу в базе данных «Соцэк МО»	до 25 декабря 2021 г.	Сектор развития территорий Михайлова С.А.
2.	<p>Лишнее действие, АГ ЧР уже сделала рассылку запроса всем министерствам;</p> <p>- лишнее действие, приемная уже сделала рассылку запроса всем отделам министерства;</p> <p>- лишнее действие, уточнение и напоминание о необходимости представления данных;</p> <p>- лишнее действие телефонный звонок, так как почта просматривается не часто, либо задержка ответа, приходится напоминать.</p>	1. Ежемесячное обновление данных в базе данных «Соцэк МО»	до 20 числа месяца следующего за отчетным	ОИВ ЧР

Эффективность реализации проекта

Текущий показатель	Целевой показатель
4 дня	7 часов
2 дублирования	Нет дублирования

Сокращение
времени
подготовки
информации

на 7
часов

Полученная
экономия

783,4
тыс.
рублей

168
чело-
век

Количество
сотрудников

52 еди-
ницы

Количество
информации
